

Ofício nº 2545/2019-GAPRE

Maringá, 23 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

Tendo em vista o Requerimento nº 2008/2018 apresentado pelo Vereador **Paulo Rogério do Carmo** para informações sobre os serviços realizados no acesso ao Jardim Bertioga, nas proximidades do Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul), anexamos os pareceres das Secretarias Municipais de Obras Públicas e Serviços Públicos.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PARECER INFORMAÇÃO Nº 268/2019-GFOP/SEMOP

Intervenção: Execução das obras de calçada em concreto
Local: Rua Pion Gertrude Heck Fritzen
Contrato: 11/2018
Empresa: RM Garcia & CIA LTDA ME
Processo: 1389/2017

Assunto: Informações relativas aos serviços realizados no acesso ao Jardim Bertioga, nas proximidades do anel viário Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul).

Com relação aos itens 1 e 3 do Requerimento n.º 2008/2018, por se tratarem de manutenção, não fazem parte do escopo desta secretaria.

Objeto: execução das obras de calçada em concreto (1.284,58 m²), na zona 38, englobando o fornecimento do material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a perfeita execução dos trabalhos.

Com relação ao item 2, o custo de implantação das calçadas é de R\$ 87.183,17, conforme espelho do acompanhamento e fiscalização de contratos anexo.

Anexos:

- 1- Prancha 01/01 referente a implantação da calçada com o detalhamento da execução com rampas de acessibilidade, piso em concreto desempenado, piso tátil, piso tátil de alerta e área referente ao plantio de grama.
- 2- CI 2018076927 e anexos de vistoria e intervenção necessária para solução de problema encontrado no desenvolvimento da obra.

Os serviços apresentados para a primeira medição contratual executados conforme projetos e recebidos, gerando a primeira medição no valor de R\$ 31.590,80, correspondente a 36,24 %.

No caso específico da rua Pion Gertrude Heck Fritzen, foi verificado que numa visita após a primeira medição as calçadas estavam quebradas.

Os locais que foram danificados em função do tráfego de veículos pesados, que apresentaram a maior deterioração das calçadas recém executadas são nas extremidades situadas nas curvas de acesso de veículos da rua Pion Gertrude Heck Fritzen para o anel viário Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul) e vice-versa, conforme fotos abaixo:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Anel viário Prefeito
Sincler Sambati

Raio da curva de
acesso à Gertrude
Heck Fritzen
pequeno para acesso
de caminhões.
Necessário ajuste

Calçada recém executada
deteriorada pela ação dos
rodados dos caminhões

Portanto foi verificado "in loco" a necessidade de adequação destes raios de curvatura e da pavimentação adicional para que a calçada após executada não seja danificada pelo tráfego dos veículos pesados.

Foi verificado que existe um grande fluxo de caminhões que acessam a Pion Gertrude Heck Fritzen para o anel viário Prefeito Sincler Sambati (Contorno Sul) e vice-versa.



Com relação ao raio pequeno da curva e a necessidade de adequação foi encaminhada a CI 2018076927 de 28/09/2018, informando sobre a curva com pequeno raio e a necessidade de adequação.

Estive no local ontem, 28/03/2019 e a situação está igual ao informado através da CI o que impossibilita a correção da calçada conforme os relatos acima.

A fiscalização está no aguardo de um posicionamento e da readequação do projeto para a conclusão dos serviços contratados.

Marcelo Bilhan Kerniski
CREA/PR 63.576-D
Engº Fiscal - SEMOP/PMM.

Maringá, 29 de março de 2019.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

CI On-Line

<http://intranet.maringa.pr.gov.br>

ORIGEM: MARCELO BILHAN KERNISKI (SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS)	DESTINO: MARCOS MITSUO MIURA (SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS)	LOCAL ATUAL : MAURI FERIGATTO (SEMUSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS)	CI-Nº 2018076927 DATA 28/09/2018 16:11
--	---	--	--

ASSUNTO: Irregularidades - calçadas

Boa tarde
Anexo relatório de ações consideradas necessárias para as obras das calçadas.
Att

CIENTE: ADRIANA POLO MURTA LIMONTA Moderado em 28/09/2018 16:20



MARCELO BILHAN KERNISKI
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Endereço eletrônico:

Esta mensagem é oficial, conforme Decreto Municipal 291/2004 de 01 de março de 2004. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s)

DESPACHO - 11/10/2018 - 08:27

Diretora Adriana, segue parecer do eng.º fiscal Marcelo com algumas inconformidades nas calçadas. Acredito que algumas delas a SEMUSP possa nos ajudar.

Att



MARCOS MITSUO MIURA
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Endereço eletrônico:

Esta mensagem é oficial, conforme Decreto Municipal 291/2004 de 01 de março de 2004. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s)

DESPACHO - 29/11/2018 - 14:07

Boa tarde Dani,

poderia verificar a possibilidade de efetuar intervenções no intuito de sanar os problemas apontados.

Podemos marcar para ajustarmos as intervenções necessárias.

Att,

Adriana Limonta.



ADRIANA POLO MURTA LIMONTA
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Endereço eletrônico:

Esta mensagem é oficial, conforme Decreto Municipal 291/2004 de 01 de março de 2004. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s)

DESPACHO - 03/12/2018 - 16:47

Mauri
Favor verificar o solicitado



DANIELLI SEVULSKI SANTOS
SEMUSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Endereço eletrônico:

Esta mensagem é oficial, conforme Decreto Municipal 291/2004 de 01 de março de 2004. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s)

DESPACHO - 04/12/2018 - 08:48

BOM DIA MAURI, ENCAMINHADO ESTE CI AO SEUS CUIDADO.

**AMAURI SÚNIGA****SEMUSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**


Endereço eletrônico:

Esta mensagem é oficial, conforme Decreto Municipal 291/2004 de 01 de março de 2004. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s)

Intervenções necessárias verificadas nas obras das calçadas:

Rua Pedro Gabriel dos Santos x Av das Palmeiras – OS 42/2018

- 1- Tampa de concreto armado danificada, boca de lobo assoreada com terra. Em frente ao poste IP 13.

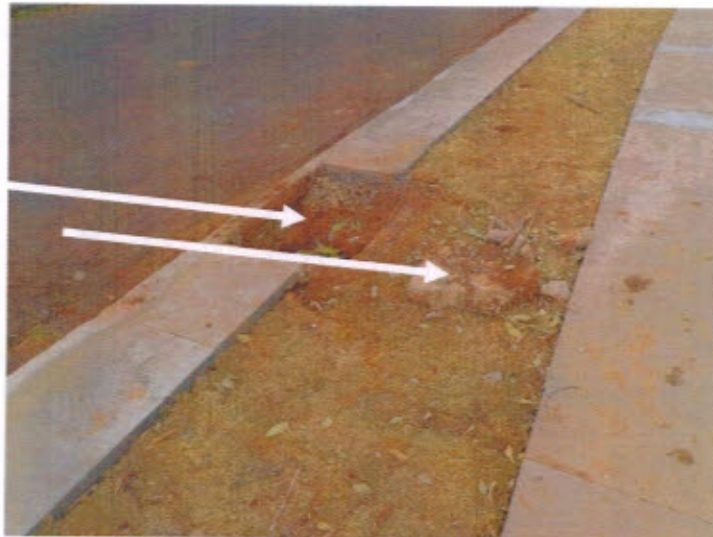

- 2- Aterro apresentando sinais de ruptura – Provável causa má e/ou ausência de compactação.



Rua Pedro Gabriel dos Santos x Hermínio Gerardi – Conj. Habitacional Herma Moraes –
OS 40/2018

1- Corte de árvores sem a retirada total do tronco e raízes



Rua Pedro Gabriel dos Santos x Rua Pion. Olinto Mariani



Rua Pedro Gabriel dos Santos –
feito recape da rua e deixado
resíduos sobre a calçada – resíduo
em local inadequado.



Caveleto da boca de lobo
quebrado- solicitar troca

Rua Pedro Gabriel dos Santos – Zona 53



Aterro com material inadequado, não compactado, carregado pelo escoamento de água de chuva, deixando a calçada suspensa.

Rua Pioneiro Pedro Gabriel dos Santos com a Rua Almerinda Silveira Coelho –
OS 45/2018



Cavalete da boca de lobo
quebrado- solicitar troca

Rua Pion Gertrude Heck Fritzen – Jd Bertioga – Parque Residencial Aeroporto



Curva com raio
pequeno para o
acesso de
caminhões que
vem da rodovia.

Necessária a
readequação do
raio da calçada e
ampliação da área
do asfalto.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Marcelo Bilhan Kerniski
CREA/PR 63.576-D
Engº Civil - SEMOP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Gerência Administrativa - SEMOP
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

29/03/2019 - Pág. 1/1

Ordem de Serviço: 51/2018 **Data: 04/07/2018** **Situação: - 36,24%**

ESPECIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO

Bem Próprio: Rua Pioneira Gertrude Heck Fritzen ID SimAM:-0
Endereço: Rua Pioneira Gertrude Heck Fritzen paralelo ao Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti, Jardim Bertioga /PArq
Intervenção: Execução das obras de calçada em concreto na Zona 38
Objeto: Execução das obras de CALÇADA EM CONCRETO (1.284,58m²), na ZONA 38, englobando o fornecimento de material, mão de obra e de todos os equipamentos necessários para a perfeita execução dos trabalhos. Localização: Rua Pioneira Gertrude Heck Fritzen paralelo ao Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti, Jardim Bertioga/Parque Residencial Aeroporto Parte II e III, Zona 38, Maringá-PR. CD-Patrimônio nº 38000001 e CD-Bem nº 610000357. De acordo com a Planilha de Serviço e prancha 01/01. Conforme Ata de Registro de Preços nº 011/2018, Concorrência nº 015/2017 e Processo nº 1389/2017. Nota de Empenho 15046/2018.

EMPRESA

Empresa: R M GARCIA & CIA LTDA ME CNPJ: 08.696.723/0001-89
Endereço:
Responsável: RODOLPHO MARTINS GARCIA CPF: 086.945.219-38
Engenheiro: JOAO BATISTA GARCIA CPF: 169.428.509-00
Telefone: (44)3264-2921 FAX: Celular: (44)9950-3084 E-mail: RMGARCIACONSTRUTORA

MODALIDADE	Nº LICITAÇÃO	NATUREZA/DESPESA	Nº/ANO CONVÊNIO	PROCESSO
Concorrência	15/2017	4.4.90.51.00.00	/	1389/2017

CONTRATO

Nº/Ano Contrato	Prazo Execução	Prazo Vigência	Término Execução	Término Vigência	Dimensão	Medida	Valor
11/2018	60	365	02/09/2018	30/01/2019	1.284,58	Metro Quadrado	87.183,17

ADITIVOS - PRAZO/VIGÊNCIA/VALOR

Nº Aditivo	Data	Paralisado	Paralisado Vigência	Prazo	Vigência	Valor	Valor Redução
------------	------	------------	---------------------	-------	----------	-------	---------------

REPROGRAMAÇÃO

Nº Contrato	Data Contrato	Data Início	Prazo Normal		Novo Prazo		Término		Valor Contrato:	87.183,17
			Execução	Vigência	Execução	Vigência	Execução	Vigência	Valor Aditivo (+):	0,00
11/2018	30/01/2018	04/07/2018	60	365					Valor Redução(-):	0,00
									Valor Total:	87.183,17

ACOMPANHAMENTO - Contrato

Contrato: 11/2018

Valor: R\$ 87.183,17

Nº	Data	T.A	Nº N.E.	Percentual		Valor da Medição		Saldo	Fiscal
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		
1	31/08/2018	Medição		36,24%	36,24%	31.590,80		55.592,37	MARCELO BILHAN F
2	31/10/2018	Medição		0,00%	36,24%	0,00	31.590,80	55.592,37	MARCELO BILHAN F
3	28/12/2018	Medição		0,00%	36,24%	0,00	31.590,80	55.592,37	MARCELO BILHAN F
4	31/01/2019	Medição		0,00%	36,24%	0,00	31.590,80	55.592,37	MARCELO BILHAN F

FATURAMENTO

SOBRAS

CONTRATOS	31.590,80	36,23%	CONTRATOS	55.592,37	63,77%
ADITIVOS	0,00	0,00%	ADITIVOS	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	31.590,80	36,23%	SALDO GERAL	55.592,37	63,77%



Prefeitura Municipal de Maringá
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Gerência de Manutenção de Pavimentação e Galerias.

Processo nº: 84161/2018

Requerimento 2008/2018 – VER. PAULO ROGÉRIO DO CARMO

Prezado Senhor,

Vimos por meio desta informar a Vossa Senhoria que, em relação ao solicitado, no item 1. foram utilizadas 15hs de máquina para terraplenagem no local com aplicação de 36 viagens de terra.

Encaminhamos para Gerência de Praças Parques Jardins e Roçadas para complementação de informação sobre a manutenção de grama no item 1. e resposta do item 3.

Sem mais, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pelos telefones (44) 3261-5545 / (44) 99118-3566.

Maringá, 24 de Abril de 2019

Alexandre Hissao Guinoza
Matrícula 73951

SEMUSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Gerência de Manutenção de Pavimentação e Galerias



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHO / PARECER

REQUERENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ

PROCESSO: 84161 /2018

Ao Expediente

Informamos que em resposta ao item 1; Não são contratadas nenhuma empresa para esse serviço ,a prefeitura mesmo que faz.
Sobre o item 3, são feitos periodicamente.

Att.

Mgá, 03/07/2019

JOÃO FRAGOSO
G.P.P.J.R

Ciente
Vagner de Oliveira
Matricula 74067 - Decreto 1328/2018
Secretário Muni. de Serviços Públicos
Mgá, 12/07/19
